PDOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
KEGIATAN FISIK DD TAHUN ANGGARAN 2024
RABAT BETON JALAN RT OO1, RW 001
DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Kedarpan, 05 Januari 2024

Nomor : 1/I/TPK/2024
Lamp :
Hal : Pemberitahuan

Kepada
Yth, CV. MITRA SEJATI
Di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan,Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga,Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

1. Ruang lingkup pekerjaan berupa pembangunan Jalan Rabat Beton
2. Daftar barang/jasa.

NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA
1	Porland Cement	Kemasan 50 kg	7.100	kg		
2	Pasir pasang	Butiran kasar	17,89	m^3		
3	Batu pecah 2/3	Tampak 2 muka	26	m^3		
JUMLAH						

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 10.000,00 dan harus sudah kami terima tgl 7 Januari 2024
2. Surat penawaran dilampiri :
   a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa penggandaan;
   b. Spesifikasi barang/jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
   c. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
   d. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
   e. Surat pernyataan kebenaran usaha; dan
   f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Plt Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

CV. MITRA SEJATI

Menyediakan : Bahan Bangunan, Aspal, dan Perpipaan
Alamat Kantor : Desa Kedarpan - Kejobong - Purbalingga

Kedarpan, 7 januari 2024

Nomor : 1/I/2024
Lamp :
Hal : Penawaran harga

Kepada
Yth, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Kedarpan
Di
Tempat

Menanggapi surat penawaran dari Ketua Tim Pelaksana Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Nomor ; 1/I/TPK/2024 Tanggal 05 Januari 2024, hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut'

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan persyaratan sebagaimana termuat dalam lampiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar rincian penawaran harga;
2. Spesifikasi barang/jasa atau kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Waktu pelaksanaan kegiatan;
4. Surat pernyataan kebenaran usaha; dan
5. Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP)

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

CV. MITRA SEJATI
Pimpinan

SUPIRNO

CV. MITRA SEJATI

Menyediakan : Bahan Bangunan, Aspal, dan Perpipaan
Alamat Kantor : Desa Kedarpan - Kejobong – Purbalingga

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA
1	Porland Cement	Kemasan 50 kg	7.100	kg	1.500	10.650.000
2	Pasir pasang	Butiran kasar	17,89	m^3	230.000	4.115.000
3	Batu pecah 2/3	Tampak 2 muka	26	m^3	270.000	7.020.000
JUMLAH						21.785.000

CV. MITRA SEJATI
Pimpinan

SUPIRNO

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Kedarpan, 08 Januari 2024

Nomor : 2/I/TPK/2024
Lamp :
Hal : Undangan

Kepada
Yth, CV. MITRA SEJATI
Di
Tempat

Menanggapi surat Saudara tentang ajuan penawaran harga Nomor :1/I/2024 Tanggal 07 Januari 2024 hal penawaran harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosisai harga terhadap penawaran Saudara tersebut;
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	09 Januari 2024
Jam	:	13.00 wib s/d selesai
Tempat	:	Balai Desa Kedarpan
Acara	:	Negosiasi harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Plt Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
NOMOR 3/I /2024

Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul 13.00 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan negoisasi harga atas pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pada saat klarifikasi dan negoisasi harga menyatakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penyedia barang/jasa menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan prospek pekerjaan pengadaan barang/jasa;
2. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa adalah sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harta;
3. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negoisasi serta klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia barang /jasa dan selanjutnya penyedia barang/jasaakan membuat dan menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN	HARGA
1	Porland Cement	Kemasan 50 kg	7.100	kg	1.500	10.650.000
2	Pasir pasang	Butiran kasar	17,89	m^3	230.000	4.115.000
3	Batu pecah 2/3	Tampak 2 muka	26	m^3	270.000	7.020.000
JUMLAH						21.785.000

4. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negoisasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat setelah proses Klarifikasi dan negoisasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. MITRA SEJATI
Pimpinan

SUPIRNO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

Mengetahui
Plt.KasiKesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Kedarpan, 09 Januari 2024

Nomor : 4/XI/TPK/2024
Lamp : 1 (satu) Surat perjanjian
Hal : Persetujuan Penawaran Harga

Kepada
Yth, CV. MITRA SEJATI
Di
Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 1/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024 hal penawaran harga dan Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor ; 3/I/2024, maka kami sampaikan setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara beserta Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran saudara pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Januari 2024
Jam : 15.00 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kedarpan
Acara : Penandantanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Plt.Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : 5 /I /2024

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di baledesa Kedarpan , kami yang bertandatangan dibawah ini :

I Nama : TIMBUL SETIYONO
Jabatan : Plt.Kasi Kesejahteraan
Alamat : Desa Kedarpan RT 03 RW 01, Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : SUPIRNO
Jabatan : Pimpinan CV. MITRA SEJATI
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah berupa Pengadaan barang Pembangunan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya;
(2) PPIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sesuai Termin Pencairan;
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5
KAHAR/FORCE MAJEURE

1) Keadaan kahar/force majeure merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkiraan sebelumnya;
2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
   a. Bencana alam;
   b. Bencana social; dan/atau
   c. Kebakaran.
3) Apabila terjadi keadaan kahar/forci majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5) Hal-hal merugikan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KEDUA tidak termasuk kategori keadaan kahar.
6) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
7) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya n dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :
   a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui empat belas (14) hari kalender sesuai pasal 4.
   b. PIHAK KEDUA lali/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7
SANKSI

1) PIHAK KEDUA dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja, perbuatan atau tindakan sebagai berikut :

   a. Berusaha mempengaruhi PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa atau pekerjaan;
   c. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;
   d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja;

2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
   a. Sanksi administrative, berupa peringatan/teguran tertulis;
   b. Gugatan secara perdata; dan/ atau
   c. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4) Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 10% dari nilai pekerjaan dengan nomimal denda sebesar Rp. 2.178.500,00 (Dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 1, maka PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yangdipimpin oleh Kepala Desa.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. MITRA SEJATI	Plt.Kasi Kesejahteraan
Pimpinan	
SUPIRNO	TIMBUL SETIYONO

Mengetahui

Kepala Desa

Selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

JUMONO.SH

CV. MITRA SEJATI

Menyediakan : Bahan Bangunan, Aspal, dan Perpipaan
Alamat Kantor : Desa Kedarpan - Kejobong – Purbalingga

Kedarpan, 14 Januari 2024

Nomor : 2/I/2024
Lamp :
Hal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada
Yth, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Sidanegara
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 5 /I /2024 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan Pengadaan material Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Matrial untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

CV. MITRA SEJATI
Pimpinan

SUPIRNO

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR 6 / I /2024

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

Lokasi : RT 001 RW 001 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Pada hari ini Minggu tanggal Empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul 13:30 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, kami yang bertandatangan dibawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dari CV. MITRA SEJATI.

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan dihadiri oleh TPK dan Penyedia Barang/Jasa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahan material mutu dan kualitas sesuai dengan penawaran.

NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN	HARGA
1	Porland Cement	Kemasan 50 kg	7.100	kg	1.500	10.650.000
2	Pasir pasang	Butiran kasar	17,89	m^3	230.000	4.115.000
3	Batu pecah 2/3	Tampak 2 muka	26	m^3	270.000	7.020.000
JUMLAH						21.785.000

2. Spesifikasi teknis dan barang terkirim lengkap sesuai penawaran

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. MITRA SEJATI
Pimpinan

SUPIRNO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

Plt.Kasi Kesejahteraan

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR 7 /I /2024

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat Pukul 14:00 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, telah dilaksanakan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalinggaantara :

I Nama : Sarmin
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Kedarpan
Alamat : Desa Kedarpan RT. 06/03 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : SUPIRNO
Jabatan : Pimpinan CV. MITRA SEJATI
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 5 /I /2024 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.telah membayar untuk pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 21.785.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).termasuk pajak dan bea materai.

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1 Tahun 2024 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.telah melaksanakan pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebesar Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga termasuk pajak dan bea materai.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. MITRA SEJATI	Kaur Keuangan
SUPIRNO	SARMIN

METERAI TEMPEL 10000 86354AKX694750776

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR 8 /I /2024

Pekerjaan : Pengadaan material Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 dan perawatan jalan Desa Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
Lokasi : Dusun 1 RT 001 RW 001 Desa Kedarpan

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul 15:00 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, kami yang bertandatangan dibawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dari CV. MITRA SEJATI

I Nama : TIMBUL SETIYONO
Jabatan : Plt.Kasi Kesejahteraan
Alamat : Desa Kedarpan RT. 03 /01 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : SUPIRNO
Jabatan : Pimpinan CV. MITRA SEJATI
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa Pengadaan Matrial pembangunan Pengaspalan dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor :5 /I /2024

PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan berupa Pengadaan Matrial Pembangunan Pengaspalan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor :5 / I /2024

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. MITRA SEJATI



SUPIRNO

Plt.Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

Mengetahui
Kepala Desa
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

BERITA ACARA LAPORAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR 9 /I /2024

Kedarpan, 30 Januari 2024

Nomor : 9/I/2024
Lamp : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Pekerjaan

Kepada
Yth : Kepala Desa
Cq.
Plt. Kasi Kesejahteraan
Di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024.

Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

SUTARYO

BERITA ACARA PENERIMAAN SERAH TERIMA
NOMOR 10 / I /2024

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul 13:30 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, telah dilaksanakan serah terima atas pekerjaan Pembangunan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.antara :

I Nama : TIMBUL SETIYONO
Jabatan : Plt.Kasi Kesejahteraan
Alamat : Desa Kedarpan RT 003/001 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : SUTARYO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Alamat : Desa Kedarpan RT. 004/002 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan Rabat Beton RW 001 RW 001 Desa Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalinga sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 6 Tahun 2024

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt.Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua



SUTARYO

Mengetahui
Kepala Desa



JUMONO.SH

BERITA ACARA PENERIMAAN SERAH TERIMA
NOMOR 11/ I /2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pada pukul 14:015 WIB bertempat di Balai Desa Kedarpan, telah dilaksanakan serah terima atas pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalinga sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 6 Tahun 2024 antara :

I Nama : JUMONO.SH
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kedarpan RT. 04/02 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : TIMBUL SETIYONO
Jabatan : Plt.Kasi Kesejahteraan
Alamat : Desa Kedarpan RT. 03/01 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalinga sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 6 Tahun 2024

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

METERAI TEMPEL 10000 029C3AKX694750762

JUMONO.SH

Plt.Kasi Kesejahteraan

TIMBUL SETIYONO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)
DANA DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RABAT BETON TAHUN 2024

Desa	:	Kedarpan
Kecamatan	:	Kejobong
Kabupaten	:	Purbalingga
Lokasi	:	Dusun I RT 01/01
Jenis Kegiatan	:	Rabat Beton
Volume	:	Rabat beton 139 m x 2 m x 0,12 m = 33,36 M^3

Pagu Dana	30.955.000
Swadaya	-
Jumlah	30.955.000

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	ANALIS	HARGA SATUAN	DANA DESA	SWADAYA	TOTAL DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Pekerjaan Persiapan**							
	1. Ultzet/Pengukuran	3	ho	Taksir	70.000	210.000	-	210.000
	2. Pembersihan Lokasi	3	ho	Taksir	70.000	210.000	-	210.000
	3. Papan Kegiatan	1	ls	Taksir	150.000	150.000		150.000
	4. Prasasti	1	ls	Taksir	250.000	250.000		250.000
	5. Begisting	48	m	Taksir	25.000	1.200.000	-	1.200.000
	6. Plastik Dasar	11	m	Taksir	40.000	440.000	-	440.000
Sub Total I						**2.460.000**	-	**2.460.000**
II	**Pekerjaan Rabat Beton**							
	1. Rabat Beton (1 : 3 : 5)	33,36	m^3	W.5	854.150	28.494.444	-	28.494.444
Sub Total II						**28.494.444**		**28.494.444**
	Jumlah Total I + II					**30.954.444**		**30.954.444**
Di Bulatkan						**30.955.000**		**30.955.000**

Kedarpan,..... 2024

Pagu Dana	:	Rp 30.955.000
Swadaya	:	Rp -
Jumlah	:	Rp 30.955.000

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH

Dibuat Oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

DIPERIKSA :
TIM VERIFIKASI DPU-PR KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA UPTD Rj2I WILAYAH BUKATEJA

BUDIYANTO, ST.
NIP. 19750421 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

RENCANA KEBUTUHAN BAHAN DAN UPAH (RKBU)
DANA DESA PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PERDESAAN DESA KEDARPAN TAHUN 2024

Desa : Kedarpan
Kecamatan : Kejobong
Kabupaten : Purbalingga
Lokasi : Dusun I RT 01/01
Jenis Kegiatan : Rabat Beton
Volume : Rabat beton 139 m x 2 m x 0,12 m = 33,36 M^3

Pagu Dana : Rp. 30.955.000
Swadaya : Rp. 0
Jumlah : Rp. 30.955.000

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN	DANA DESA	SWADAYA	TOTAL DANA
1	2	3	4	5	7	8	9
I	**Pekerjaan Rabat Beton**						
	I. BAHAN						
	1. Semen	7.100	kg	1.600	11.360.000	-	11.360.000
	2. Batu Pecah Mesin 2/3	26,00	m^3	270.000	7.020.000	-	7.020.000
	3. Pasir Pasang	17,89	m^3	230.000	4.115.000	-	4.115.000
	4. Air Kerja	6,00	m^3	50.000	300.000		300.000
	Sub Total I				**22.795.000**	-	**22.495.000**
	II. ALAT						
	1. Plastik dasar	11	rol	40.000	440.000	-	440.000
	2. Begisting	48	m	25.000	1.200.000	-	1.200.000
	3. Papan kegiatan	1	bh	150.000	150.000	-	150.000
	4.Prasasti	1	bh	250.000	250.000	-	250.000
	Sub Total II				**2.040.000**	-	**2.040.000**
	III. UPAH						
	1. Tukang batu	10	hok	80.000	800.000	-	800.000
	2. Pekerja	76	hok	70.000	5.320.000	-	5.320.000
	Sub Total III				**6.120.000**	-	**6.120.000**
	Jumlah TotalI+II+ III				**30.955.000**	-	**30.655.000**
	Jumlah Total dibulatkan				**30.955.000**	-	**30.955.000**

Kedarpan,..... 2024

Pagu Dana : Rp. 30.955.000
Swadaya : Rp. 0
Jumlah : Rp. 30.955.000

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH

Dibuat Oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)
DANA DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RABAT BETON TAHUN 2024

Desa : Kedarpan
Kecamatan : Kejobong
Kabupaten : Purbalingga
Lokasi : Dusun I RT 01/01
Jenis Kegiatan : Rabat Beton
Volume : Rabat beton 139 m x 2 m x 0,12 m = 33,36 M^3

Pagu Dana 30.955.000
Swadaya -
Jumlah 30.955.000

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	ANALIS	HARGA SATUAN	DANA DESA	SWADAYA	TOTAL DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Pekerjaan Persiapan**							
	1. Ultzet/Pengukuran	3	ho	Taksir	70.000	210.000	-	210.000
	2. Pembersihan Lokasi	3	ho	Taksir	70.000	210.000	-	210.000
	3. Papan Kegiatan	1	ls	Taksir	150.000	150.000		150.000
	4. Prasasti	1	ls	Taksir	250.000	250.000		250.000
	5. Begisting	48	m	Taksir	25.000	1.200.000	-	1.200.000
	6. Plastik Dasar	11	m	Taksir	40.000	440.000	-	440.000
Sub Total I						**2.460.000**	-	**2.460.000**
II	**Pekerjaan Rabat Beton**							
	1. Rabat Beton (1 : 3 : 5)	33,36	m^3	W.5	854.150	28.494.444	-	28.494.444
Sub Total II						**28.494.444**		**28.494.444**
	Jumlah Total I + II					**30.954.444**		**30.954.444**
Di Bulatkan						**30.955.000**		**30.955.000**

Kedarpan,..... 2024

Pagu Dana : Rp 30.955.000
Swadaya : Rp -
Jumlah : Rp 30.955.000

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH

Dibuat Oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

DAFTAR SATUAN HARGA BARANG DAN UPAH
DANA DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RABAT BETON JALAN TAHUN 2024

No		BARANG/UPAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
I.		**Bahan Material**		
	1	Batu Pecah Mesin 2/3	m^3	270.000,00
	2	Pasir Pasang	m^3	230.000,00
	3	Porland Cement	kg	1.600,00
	4	Air Kerja	liter	50,00
II.		**Alat**		
	1	Plastik dasar	rol	40.000,00
	2	Glugu	m	25.000,00
	3	Papan Nama Proyek	bh	150.000,00
	4	Prasasti	bh	250.000,00
III.		**Upah Tenaga Kerja**		
	1	Pekerja	hok	70.000,00
	2	Tukang batu	hok	80.000,00

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KEJOBONG

DESA KEDARPAN


BACK UP PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Kegiatan Rabat Beton

Lokasi Dusun I RT 01/01

: Rabat beton 139 m x 2 m x 0,12 m = 33,36 M^3

PECING

NO		PERHITUNGAN						VOLUME
		p	x	l	x	T		
		139,00	x	2,0	x	0,12		33,36

Kedarpan,..... 2024

MENGETAHUI :
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH

DIBUAT OLEH :
Kaur Perencanaan

SUTARYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DANA DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RABAT BETON JALAN TAHUN 2024

NO	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH	JUMLAH
I.					HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON		
1	VII.I		1	M³	**Membuat beton tumbuk 1 pc : 3 ps : 5 Kr**		
					a. Tenaga		
			1,65	0h	Pekerja	70.000,00	115.500,00
			0,25	0h	Tukang Batu	80.000,00	20.000,00
						JUMLAH A	**135.500,00**
					B. Bahan		
			218	kg	Portland cement	1.600,00	348.800,00
			0,54	m³	Pasir Pasang	230.000,00	124.200,00
			0,87	m³	Batu Pecah 2/3	270.000,00	234.900,00
			215	ltr	Air Kerja	50,00	10.750,00
						JUMLAH B	**718.650,00**
						JUMLAH A + B	**854.150,00**

Mengetahui
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH.

Dibuat Oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (SCHEDULE) RABAT BETON
DANA DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PERDESAAN DESA KEDARPAN TAHUN 2024

Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga satuan	DANA DESA (Rp)	Bobot (%)	HARI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ket
rjaan Pengaspalan Jalan																
jaan Persiapan																
/Pengukuran	3,00	ho	70.000	210.000												
ersihan Lokasi	3,00	ho	70.000	210.000												
Kegiatan	1,00	ho	150.000	150.000												
ti	1,00	ho	250.000	250.000												
jaan Rabat Beton				-												
aran Cor Beton (1 : 3 : 5)	33,36	m²	854.150	28.494.444												
dan Alat				-												
dasar	10,00	rol	45.000	450.000												100%
ing	48,00	m²	25.000	1.200.000												
		JUMLAH	70.000	-												
RENCANA MINGGUAN																
KOMULATIF RENCANA MINGGUAN																
PROSENTASE KOMULATIF RENCANA MINGGUAN																



Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan


JUMONO,SH

Dibuat Oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO

DENAH LOKASI RABAT BETON

T

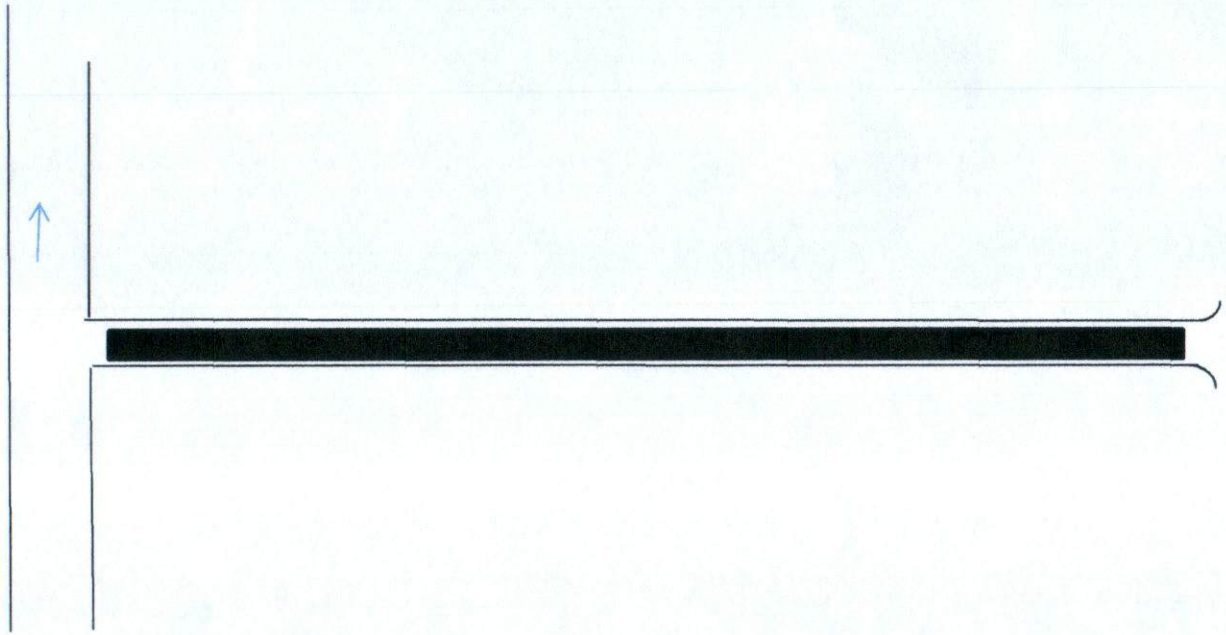

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Kecamatan Kejobong **Desa Kedarpan**
Jenis Prasarana **Rabat Beton**
Lokasi **Dusun I RT 01/01**
Judul **Denah Lokasi Kegiatan**
Dibuat Oleh : Kaur Perencanaan **SUTARYO**
Kepala Desa **JUMONO,SH**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
KEGIATAN RABAT BETON RT 01/01 SILPA DANA DESA
DESA KEDARPAN TAHUN 2024

No	ANALIS	URAIAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	VII.I	Rabat Beton (1 : 3 : 5)	854.150

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO,SH.

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan

SUTARYO
